



USFEA



Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila

***RAPPORTO SULLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 6 APRILE 2009
NEL COMUNE DELL'AQUILA***



L'Aquila – 6 aprile 2025





1 Premessa

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila (USRA) nasce nel 2013 dalle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 67-ter del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, unitamente ad un Ufficio Speciale omologo per i Comuni del Cratere, successivamente all'inizio della gestione ordinaria della ricostruzione legata agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno gravemente danneggiato il territorio della Città dell'Aquila e quello dei Comuni del cosiddetto "cratere sismico".

Il sopra richiamato comma 2 ha definito i compiti istituzionali fondamentali dell'USRA articolati come di seguito:

- fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata;
- promuovere la qualità della ricostruzione;
- effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi;
- assicurare nel proprio sito internet istituzionale un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi;
- eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con riferimento alla coerenza e conformità urbanistica ed edilizia, nonché della congruità tecnica ed economica;
- curare l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

Il modello degli Uffici Speciali è stato riproposto per il Sisma del Centro Italia e per altri eventi sismici, benché, per ogni evento calamitoso, sia stata emanata una legislazione specifica che, al di là del nome assegnato agli uffici, ha connotato diversamente le strutture a seconda del caso.

A livello governativo è stata appena approvata la Legge 18/03/2025 n. 40, "**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**", pubblicata sulla G.U. serie generale n. 76 del 01/04/2025, che, tra l'altro, propone la creazione di uno specifico Dipartimento delegato alle ricostruzioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile.

Una simile disposizione consentirà di non dover "*ripartire da zero*" quando purtroppo si dovesse verificare un nuovo evento calamitoso, partendo dalla consapevolezza che il nostro territorio è soggetto a periodici fenomeni di emergenza di natura sismica, idrogeologica e vulcanica.

Nello specifico dell'attività dell'USRA, dal momento della sua costituzione ad oggi, l'Ufficio si è impegnato nei vari compiti istituzionali e, con riferimento alla ricostruzione privata, ha consentito di raggiungere il





risultato di n. 29.284 pratiche di richiesta di contributo definite, su un totale di n. 29.828 pratiche presentate, a seguito della prima emergenza post sisma.

In termini economici si tratta di un importo complessivo ammesso a contributo pari ad € 6.656.617.239 a fronte di un importo richiesto pari a € 7.378.976.345, oltre ad un ulteriore importo richiesto pari ad € 665.345.825 corrispondente a circa n. 544 pratiche residuali da definire.

Ad oggi la ricostruzione privata è al 98% in termini di numero di pratiche presentate, mentre risulta ad un 88% in termini di importi istruiti sul totale richiesto.

Oggi l'USRA è in una nuova fase di trasformazione, a seguito delle nuove funzioni assegnate dalle previsioni del comma 2-bis dell'art. 54 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, in termini di supporto alla ricostruzione pubblica e, in particolare, degli interventi previsti nell'ambito del PNRR e del PNC.

Non possono infine non evidenziarsi quelli che si ritengono i fattori essenziali che hanno permesso all'USRA nel corso di questi anni di compiere il proprio percorso:

- l'impostazione delle norme istitutive che ha consentito lo sviluppo di un assetto organizzativo flessibile, capace di miglior adattamento alle esigenze mutevoli nel tempo;
- la composizione delle risorse umane, individuate tramite procedure concorsuali, in buona parte di giovane età, ma anche con unità dotate di precedenti esperienze nel campo della pubblica amministrazione;
- la creazione di un ufficio *'ex-novo'*, con la possibilità di mettere in campo un assetto non condizionato da schemi prefissati. Tale fattore, se trasposto al caso di una pubblica amministrazione esistente e consolidata, dovrebbe far avviare processi di verifica della validità degli assetti consolidati, al fine di eventualmente rivederli e migliorarli, nell'ottica di una migliore efficienza e funzionalità;
- l'aspetto motivazionale ed il senso di squadra che ha determinato, nei momenti più attivi dell'USRA, la valorizzazione delle risorse presenti ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la trasparenza dei processi eseguiti dall'Ufficio, attuata non solo per l'adempimento di un obbligo normativo, ma con l'intento di fornire un servizio, cercando di cogliere i *'feed back'* da parte dei soggetti interessati, al fine di apportare le necessarie migliorie;
- l'individuazione degli obiettivi annui dell'Ufficio, secondo criteri reali, attuali e concreti, ed il perseguimento degli stessi, da parte di tutte le componenti interessate.





2 Lo stato della ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila

Dovendo fornire un quadro dello stato della ricostruzione, per prima cosa, si riportano i dati della **ricostruzione privata** aggiornati ad oggi.

Ricostruzione privata

Sintesi delle attività
per la Ricostruzione dell'Aquila aggiornato al 02/04/2025

Pratiche

Pratiche presentate

29.828

Pratiche concluse

29.284

di cui 3.592 annullate/archivate

Pratiche da istruire

544

% pratiche istruite sul totale presentate

98%

Importo richiesto

€ 8.355.341.300

Importo concesso concluse

€ 6.656.617.239

di € 7.378.976.345 importo richiesto concluse

€ pratiche archiviate/annullate

Importo richiesto da istruire


€ 665.345.825

% importi istruiti sul totale richiesto

88%

I dati sopra riportati sono la sintesi complessiva delle attività istruttorie che si sono attuate negli anni 2009 - 2025, fino allo stato attuale, così come meglio riportato nel grafico seguente.



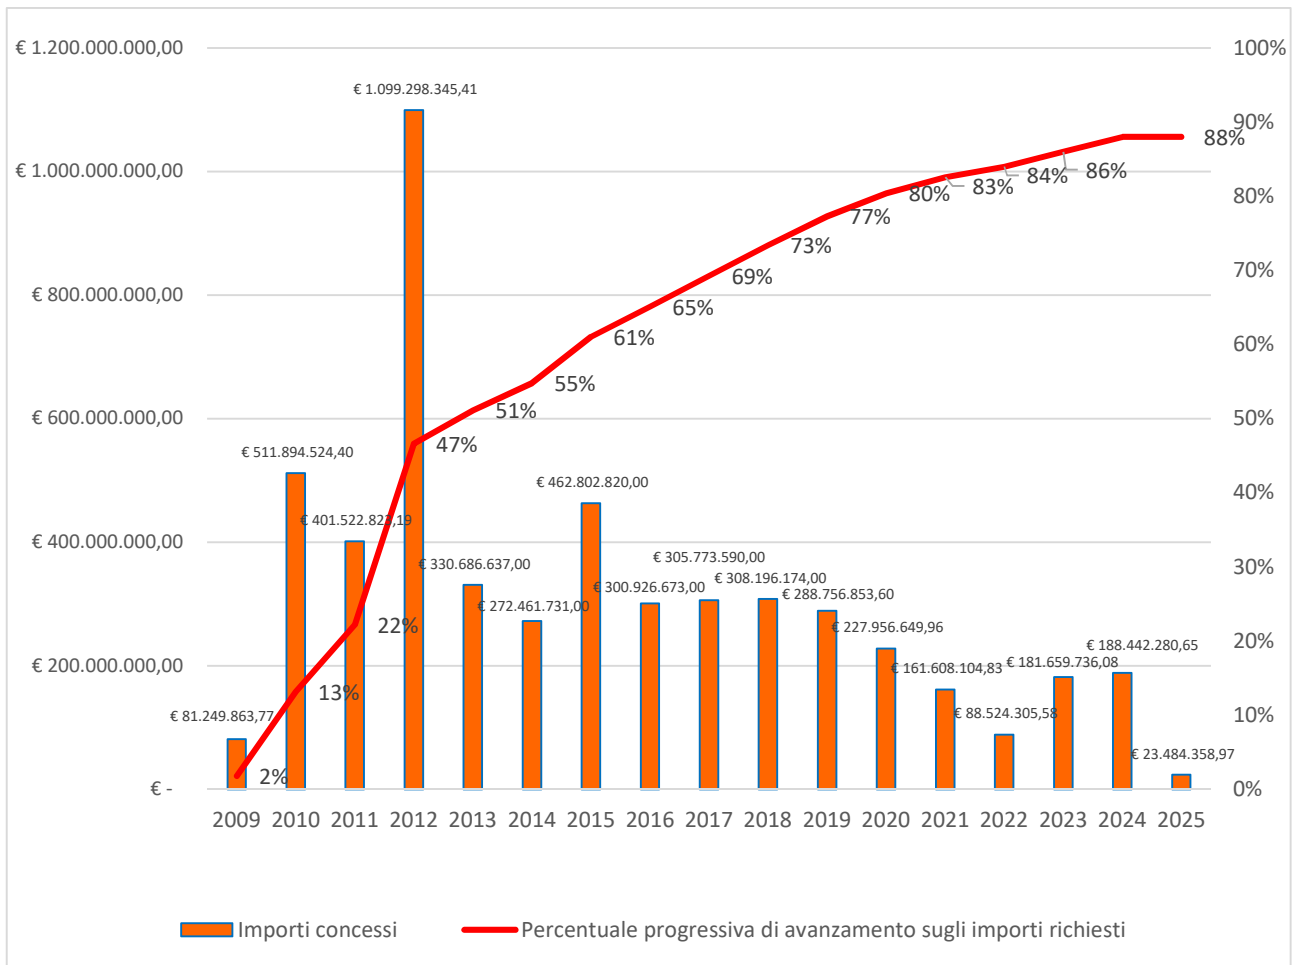

Dal grafico sopra riportato, oltre ai valori assoluti degli importi concessi per singola annualità, si osservano gli andamenti delle percentuali di avanzamento della ricostruzione privata, in termini di importi richiesti, attualmente pari ad 88%. Dal punto di vista della realizzazione fisica degli interventi, l'avanzamento della ricostruzione privata si attesta intorno al 73 – 74%.

Complessivamente a fronte di un importo totale richiesto delle pratiche istruite pari ad € 7.378.976.345 si individua un importo totale concesso pari ad € 6.656.617.239. La differenza tra i suddetti importi, evidenzia il risparmio di oltre 700 milioni di euro, in termini di spesa a carico dello Stato, derivante dall'attività istruttoria svolta dagli uffici preposti nell'immediata emergenza e dall'USRA dal 2013 in poi.





3 Lo stato della ricostruzione pubblica nel Comune di L'Aquila – Attività di monitoraggio

Si riportano di seguito i dati della **ricostruzione pubblica**, in base alle informazioni del monitoraggio fisico e finanziario, coordinato dall'Ufficio Speciale nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Nello specifico per il settore della pubblica, il cui fabbisogno economico complessivo è in fase di definizione, dato che i programmi pluriennali sono in corso di aggiornamento da parte dei Soggetti Attuatori, si riscontra ad oggi un costo complessivo richiesto pari ad € 2.621.102.000 per un totale di 775 interventi.

In termini di importi il costo del finanziato dallo Stato è pari ad € 2.440.586.000, mentre quello effettivamente erogato è pari ad € 1.689.089.000.

Ricostruzione pubblica

Sintesi degli interventi per le Opere Pubbliche fino al 31/12/2024

Costo complessivo opere pubbliche
€ 2.621.102.000

Importo finanziato opere pubbliche
€ 2.440.586.000

Importo Erogato opere pubbliche
€ 1.689.089.000

% importi erogati sul totale richiesto


69.21%

Nel merito degli interventi si rileva che: 29 sono in fase di programmazione, 139 in fase di progettazione, 116 in fase di attuazione, 121 in fase di collaudo ed infine 370 risultano conclusi.

Il grafico riportato di seguito rappresenta la ripartizione percentuale dello stato di avanzamento dei suddetti interventi rispetto al totale ad oggi accertato.

STATI DI AVANZAMENTO: RIPARTIZIONE

Ripartizione percentuale degli stati di avanzamento dei lavori.

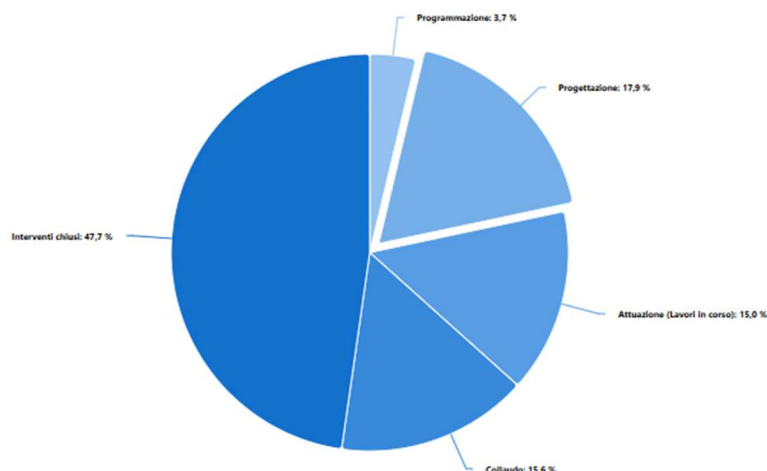



4 L'USRA la Ricostruzione Pubblica di alcuni Beni Culturali

4.1 L'Accordo Convenzione tra l'USRA ed il Segretariato Regionale per i Beni Culturali

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, nello spirito di fattiva collaborazione con gli altri Enti istituzionali impegnati nel processo della ricostruzione pubblica, ha offerto il proprio supporto per gli interventi pubblici, e nell'ambito della suddetta finalità è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Segretariato Regionale per i Beni Culturali nel mese di settembre 2020.

Con l'emanazione della legge n. 108 del 2021 è stato disposto, con il comma 2bis dell'art. 54, che: *“Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.”*

Pertanto a seguito della suddetta norma sopravvenuta, nel mese di febbraio 2022, è stata sottoscritta una specifica convenzione tra la Struttura di Missione, l'USRA, l'USRC ed il Segretariato Regionale, e successivamente lo stesso Segretariato, di concerto con l'USRA, ha individuato alcuni Beni Culturali per i quali avvalersi del supporto dell'USRA al fine di imprimere una azione di accelerazione al processo della ricostruzione degli stessi. Molteplici interventi di restauro e recupero di 16 *chiese* e due interventi di particolare rilevanza storico-artistica per la città dell'Aquila, quali il recupero e valorizzazione delle *“Mura Civiche del Centro Storico dell'Aquila”* e la *riqualificazione del Tiro a segno “A. Bafile” nel Comune di L'Aquila.*





Nel seguito si riporta una breve descrizione degli interventi articolato come si seguito:

N	Bene pubblico	Stato attuale intervento
1	Chiesa di San Flaviano in Capitignano (AQ)	Fase di consegna dei lavori
2	Chiesa di Sant'Agostino in L'Aquila	Fase di approvazione perizia di variante economica Lavorazioni II° stralcio
3	Chiesa di San Marco in L'Aquila	Fase di verifica della progettazione del II° lotto
4	Mura Urbiche	Fase di approvazione perizia di variante economica
5	Tiro a segno nazionale "A. Bafile"	Lavorazioni in esecuzione
6	Chiesa di Sant'Eugenia in L'Aquila frazione di Collefracido	Fase di predisposizione della progettazione esecutiva
7	Chiesa di San Rocco in L'Aquila frazione di Pagliare di Sassa	Fase di predisposizione della progettazione esecutiva
8	Chiesa di San Pietro Apostolo in L'Aquila frazione di Pagliare di Sassa	Fase di esecuzione delle indagini geologiche e strutturali
9	Chiesa di Santa Scolastica in L'Aquila frazione di Roio Poggio	Fase di predisposizione della progettazione esecutiva
10	Chiesa di Santa Maria Assunta in L'Aquila frazione di Poggio Santa Maria	Fase di esecuzione delle indagini geologiche e strutturali
11	Abbazia di San Giovanni Battista in Lucoli (AQ) frazione di Collimento	Fase di predisposizione della progettazione esecutiva
12	Chiesa di San Menna in Lucoli (AQ) frazione di San Menna	Fase di predisposizione della progettazione esecutiva
13	Chiesa di San Paolo a Pelutinum in Prata D'Ansionia (AQ)	Collaudo in corso
14	Chiesa di San Martino e Oratorio di San Giuseppe in Prata D'Ansionia (AQ), frazione di Tussio	Fase di affidamento della progettazione esecutiva
15	Chiesa di S. Nicola di Bari in L'Aquila frazione di Monticchio	Fase di acquisizione dell'Autorizzazione della Soprintendenza





5 L'USRA ed il PNC al PNRR

5.1 Il Piano Complementare al PNRR per le aree del terremoto 2009 e 2016

Con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato approvato il *Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza* e, con tale decreto, all'art 1 comma 2, lett. b), n. 1 è stata destinata ad un *programma di intervento per le aree del terremoto del 2009 e del 2016* la somma complessiva di 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2009 al 2026.

La governance per l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Complementare, individuata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è costituita da un organismo multilivello, una *cabina di coordinamento integrata*, composta dalla cabina del sisma 2016 con i Presidenti delle quattro Regioni coinvolte dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed i rappresentanti dei Sindaci, delegati dalle ANCI regionali, integrata dal Capo Dipartimento Casa Italia e dal Coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, dal Sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei Sindaci del cratere 2009, e presieduta dal Commissario Straordinario sisma 2016.

La cabina di coordinamento è un organismo con funzioni di regia sull'intero investimento del Fondo complementare, con compiti che vanno dall'individuazione dei Programmi di intervento, alla selezione dei Progetti, all'impulso e all'implementazione delle attività, al controllo del rispetto dei tempi e dei principi posti alla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli interventi previsti nel Piano sono riconducibili a due Macromisure:

A. CITTA' E BORGHI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI

In questa misura convergono una serie di progetti che, affiancando ed integrando gli interventi già effettuati nell'ambito della ricostruzione, hanno l'obiettivo di ridare impulso alla vivibilità dei centri urbani, rivitalizzare e riqualificare gli spazi di vita, rendere più efficiente la risposta alle esigenze dei cittadini attraverso la creazione di reti in grado di rendere "smart" le città e i borghi dei territori interessati: migliorare la qualità della vita e mantenere alti i livelli di sviluppo e tecnologia privilegiando soluzioni sostenibili e migliorando l'ambiente.





All'interno di questa misura sono poi coniugate linee d'intervento specifiche con obiettivi e finalità strutturate per aree tematiche specifiche (a titolo d'esempio: spazi urbani, mobilità, servizi digitali ecc.).

La dotazione di questa macromisura è pari ad 1 miliardo e 80 milioni di euro.

B. RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

È una misura più strettamente orientata allo sviluppo dell'imprenditorialità anche attraverso azioni che possano favorire la creazione ed il rafforzamento di reti e di conoscenze in grado di attirare investimenti e facilitare la crescita ed il rafforzamento economico dei territori.

Anche questa misura prevede diverse linee d'intervento che vanno dal sostegno e rafforzamento delle attività produttive alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, anche attraverso azioni di sistema che integrino le relazioni tra ricerca e innovazione in un'ottica di miglioramento anche sociale della residenzialità.

La dotazione di questa macromisura è pari a 700 milioni di euro.

5.2 Il ruolo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione nell'ambito del Piano complementare al PNRR

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila - ed in massima parte il suo Titolare - presente formalmente nella Cabina di coordinamento integrata senza diritto di voto, svolge un ruolo di primaria importanza ed è stato incaricato di diversi compiti, essendo stato direttamente o indirettamente coinvolto nei progetti del Piano Complementare al PNRR.

Fin dalla prima fase di individuazione dei programmi di sviluppo, infatti, l'USRA ha svolto un'importante funzione di raccordo ed interlocuzione tra i diversi attori istituzionalmente coinvolti nella delicata fase della definizione dei bisogni sulla base dei quali progettare l'ambito degli interventi.

L'esperienza acquisita attraverso l'attività più strettamente legata alla ricostruzione ha infatti reso possibile una sorta di "accountability" territoriale attraverso la quale si sono potute instaurare, negli anni, rapporti di concreta e reale collaborazione che hanno favorito e reso attuabili, i delicati interventi richiesti dal territorio nel difficile contesto della situazione emergenziale.

Nello specifico degli interventi programmati, inoltre, l'ufficio è stato individuato quale riferimento nell'ambito di diverse competenze come descritto di seguito.





a) Responsabile dell'intervento

Nell'ambito di ciascun intervento, oltre al soggetto attuatore, vengono individuati i Soggetti Responsabili degli interventi che, in sostanza, sono i soggetti ai quali il Soggetto Attuatore delega l'intero compito di realizzare e porre in essere tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo individuato - oltre che a verificarne la correttezza e garantirne la realizzazione - gestendo e rendicontando i relativi fondi. I progetti per i quali l'USRA è stato individuato quale soggetto responsabile dell'intervento sono:

- valorizzazione di tre cammini – Sentiero Italia, Cammino Alta Valle Aterno e Cammino dei Monti e dei Santi - ricompresi nella sub-misura A3, *“Rigenerazione urbana e territoriale”*, Linea di intervento 3, intitolata *“Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici”*;
- un importante progetto in ambito culturale – il Museo Nazionale d'Abruzzo, Munda - ricompreso nella sub-misura A3, *“Rigenerazione urbana e territoriale”*, Linea di intervento 2, intitolata *“Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali”*.

Di questi interventi si parlerà più diffusamente nel seguito.

b) Collaborazione e supporto ai Soggetti Attuatori

Nell'ambito di questa attività, che prevede una dinamica di relazioni ed interscambi tra gli enti a più livelli coinvolti nei processi, oltre ai più generali compiti di collaborazione istituzionale, l'USRA si è reso altresì disponibile ad offrire la collaborazione dei propri dipendenti in molti degli interventi previsti da Piano Complementare - ed attuati dal Comune dell'Aquila - con un ruolo di supporto che, valorizzando le esperienze e le competenze acquisite, mette a sistema un percorso virtuoso sperimentato negli anni.

Esemplare, a questo proposito, la collaborazione relativa all'intervento che prevede la creazione del Centro nazionale del Servizio Civile Universale nella città dell'Aquila – senza dubbio l'intervento più prestigioso del Piano Complementare sia in termini di finanziamento che in termini di complessità – che vede direttamente coinvolto il Titolare dell'Ufficio Speciale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

A questo importantissimo intervento se ne aggiunge un altro la cui rilevanza in termini di benefici per il Paese forse è addirittura superiore: la creazione a L'Aquila di una sede della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) per la formazione e la qualificazione dei tecnici che operano nella Pubblica Amministrazione. Tale intervento si colloca nell'alveo della valorizzazione delle esperienze che il personale dell'USRA ha maturato e che possono essere messe a disposizione dei tecnici della PA.





c) gestione finanziaria, rendicontazione e controllo di tutti gli interventi del territorio aquilano

L'ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi" incardina direttamente negli Uffici speciali alcune funzioni espressamente richiamate dall'ordinanza medesima.

In relazione alla gestione finanziaria, infatti, le risorse stanziare dal Ministero dell'Economia e Finanze sull'apposito capitolo dedicato agli interventi, vengono direttamente trasferite sulla contabilità degli Uffici Speciali. Tali risorse vengono poi direttamente trasferite ai soggetti responsabili degli interventi sulla base della loro richiesta, inviata alla Struttura di Missione e ai medesimi Uffici speciali, e previo esito positivo dell'istruttoria da parte degli Uffici ed assenso da parte del soggetto attuatore dagli uffici medesimi (ordinanza 17, art. 1, comma 5).

Agli adempimenti degli Uffici Speciali è dedicato poi l'intero art. 5 della citata ordinanza 17 che, prevedendo un generale compito di supervisione e controllo, attribuisce agli uffici un delicato ruolo di raccordo tra Governo ed istituzioni territoriali. Un ruolo che, in definitiva, pone a pieno titolo gli Uffici stessi in un ruolo centrale e strategico per i processi di attuazione del Piano Nazionale Complementare al PNRR.

5.3 Gli interventi

5.3.1 Musealizzazione del castello cinquecentesco dell'Aquila

Uno degli interventi più rilevanti del Fondo complementare al PNRR, è quello relativo all'allestimento museografico del Museo Nazionale D'Abruzzo all'interno del Castello Cinquecentesco dell'Aquila, a seguito dei lavori di restauro e consolidamento post sisma 2009, il cui importo complessivo lordo è pari a 8,00 mln di euro. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila è stazione appaltante e soggetto responsabile di questo ambizioso progetto che vede coinvolte figure di fama internazionale.

5.3.2 Realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale

Altro significativo intervento legato al finanziamento del Fondo Complementare al PNRR, è il progetto di realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, destinato all'accoglienza, alla residenza e alle attività di formazione dei volontari nonché al training dei docenti e dei formatori, risulta prioritario ai fini del processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale e culturale della Città dell'Aquila e ben si coniuga con il piano di riutilizzo e rifunzionalizzazione del Progetto C.A.S.E. - alloggi a suo tempo realizzati per dare ricovero ai terremotati - e del complessivo patrimonio immobiliare comunale.





Si prevede che il Centro, a regime, accoglierà 2500 volontari che saranno formati e svolgeranno attività di servizio alle comunità del territorio.

Le risorse complessivamente destinate all'intervento ammontano a complessivi 60 milioni di euro.

Anche in questo intervento, l'USRA ha un ruolo importantissimo, insieme al Comune dell'Aquila e allo studio di progettazione di *Alfonso Femia Architetti Ex 5+1*, studio di fama internazionale con sede a Parigi e Genova.

5.3.3 Il Sentiero Italia CAI

Il progetto intende valorizzare e potenziare il tracciato escursionistico del tratto abruzzese del Sentiero Italia che connette l'intero territorio nazionale, attraverso un processo di infrastrutturazione leggera al fine di favorire lo sviluppo territoriale dell'area valorizzando il territorio e le sue emergenze storiche naturalistiche ed ambientali.

L'intervento, finanziato per l'importo complessivo lordo pari a 1,50 mln di euro, è nella fase del collaudo in corso.

5.3.4 Il Cammino dei Monti e dei Santi

L'intervento ha per oggetto la realizzazione dei lavori di riqualificazione e potenziamento del "Cammino dei Monti e dei Santi" ricadente nei comuni del cratere sisma 2009, sito in diversi Comuni della Provincia dell'Aquila.

L'intervento, finanziato per l'importo complessivo lordo pari a 1,00 mln di euro, è in fase di esecuzione lavori.

5.3.5 Il Cammino dell'Alta Valle dell'Aterno

Il progetto individua, valorizzandola e potenziandola, una rete sentieristica – il Cammino dell'Alta Valle dell'Aterno - in grado di connettere il territorio ai Cammini maggiori che lo interessano, anche di carattere extra-regionale e nazionale, attraverso un processo di "infrastrutturazione leggera" in grado di favorire lo sviluppo del territorio.

L'intervento, finanziato per l'importo complessivo lordo pari a 0,40 mln di euro, è stato concluso.





5.3.6 Progetto ACCELERATE – intervento di riqualificazione della ex Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli – II° lotto

Il progetto prevede la riqualificazione del complesso della ex Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli da destinare a strutture dell'Università degli Studi dell'Aquila.

L'intervento, finanziato per 35 mln di euro, è attualmente nella fase di predisposizione della progettazione del II° lotto.

5.3.7 Progetto – lavori di ristrutturazione dell'edificio B20 del complesso di Collemaggio

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio B20 del complesso di Collemaggio da destinare a strutture del GSSI.

L'intervento, finanziato per 5,036 mln di euro, è attualmente nella fase di approvazione della perizia di variante.

5.3.8 Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Auditorium del Parco del castello dell'Aquila

Il progetto ha previsto interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Auditorium, sia nelle facciate esterne sia negli allestimenti interni, per un finanziamento di 1,5 mln di euro, e l'intervento è stato concluso.

5.3.9 Lavori di manutenzione straordinaria dei dispositivi dei “tapis roulant” del tunnel Terminal Collemaggio – Piazza Duomo

Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria e rimessa in funzione dei dispositivi dei “tapis roulant” del tunnel Terminal Collemaggio – Piazza Duomo, con un finanziamento di 1,33 mln di euro.

L'intervento è in esecuzione.

5.3.10 Parcheggio interrato Polo Universitario di Coppito (AQ)

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato a servizio del polo universitario di Coppito (AQ), con un finanziamento di 11,124 mln di euro.

L'intervento è attualmente nella fase di esecuzione delle indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva.





6 La ricostruzione degli edifici scolastici

I finanziamenti degli edifici scolastici sono stati regolamentati e stanziati nel corso degli anni tramite vari atti normativi che si riassumono come nel seguito:

N	Provvedimenti	Stanziamento
1	O.P.C.M. 3979/2011	Assegnazione di 8,5 milioni di euro all'Ufficio scolastico regionale per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013
2	Delibera CIPE 35/2012	Stanziamento di 450 milioni di euro per l'edilizia pubblica, comprensiva di quella scolastica, di cui 262 milioni di euro destinati alla Città di L'Aquila e 188 milioni di euro agli altri Comuni del cratere sismico
3	Art. 11, co. 9. del decreto-legge n. 78/2015, convertito, dalla legge n. 125/2015	Introduzione del programma pluriennale degli interventi , a cura delle amministrazioni competenti per il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati che, nel caso degli edifici adibiti ad uso scolastico, ricade nelle competenze del Ministero dell'Istruzione
4	Delibera CIPE 48/2016	Approvazione del piano stralcio e definizione del processo programmatico della ricostruzione pubblica tramite i programmi pluriennali di intervento da parte delle amministrazioni competenti individuate dalla stessa Delibera CIPE
5	Delibera CIPE 110/2017	Approvazione primo piano annuale per gli edifici scolastici con 56 interventi per € 30.405.366,67 , di cui 38 interventi di esecuzione lavori per € 22.901.247,07 e 18 interventi di sola progettazione per € 7.504.119,60. Tra i suddetti interventi 9 ricadono nel territorio del Comune dell'Aquila: 2 di competenza della Provincia per € 2.070.419,60 e 7 del Comune per € 4.100.000,00.
6	Delibera CIPE 32/2019	Modifiche alle delibere CIPE n. 48/2016 e n. 110/2017 In particolare con riferimento alla tabella allegata alla Delibera CIPE n. 48/2016 è stato precisato: «Per il settore 1 'Istruzione primaria e secondaria' il MIUR assume la competenza della programmazione del settore, mentre gli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei Comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assumono la responsabilità di attuazione del Piano annuale, sono titolari delle risorse assegnate per





		<i>l'esecuzione dei piani annuali e garantiscono la gestione del circuito finanziario».</i>
7	Delibera CIPE 72/2020	Approvazione secondo piano annuale per gli edifici scolastici con 18 interventi per € 22.855.647,88 , di cui 4 interventi di esecuzione lavori per € 7.805.305,00 ricadono sul territorio del Comune dell'Aquila
8	Delibera CIPE 10/2023	Approvazione addendum al secondo piano annuale con l'assegnazione dell'importo di € 49.447.645,98 , di cui € 33.303.405,32 a favore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive degli interventi specifici:

Finanziato ed assegnato da Piani Annuali

DENOMINAZIONE	Stazione Appartante	Tipologia Intervento	CUP	Importo approvato OE	FOI	CIPE 47/2009	CIPE 135/2012	Decreto Dist. 48/2013	CIPE 48/2016	CIPE 110/2017	CIPE 72/2020	CIPE 10/2023	Totale assegnato	
1 ITAS - Istituto Tecnico per le attività Sociali (AQ)	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia	F18E1800030001	7.404.498,00					500.000,00				500.000,00	
2 Istituto d'istruzione secondario Comunitario Nazionale "D. Cobagnoli" via L. Da Vinci	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	F18E19000030001	11.101.200,00						1.310.120,00			1.310.120,00	
3 IPSASAR - L. Da Vinci sito in Via Aldo Moro L'Aquila	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia	F18E17000040004	7.602.996,00						760.299,60			760.299,60	
4 Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola, s.p. Mausona	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C19418000210001	3.792.406,32			2.115.000,00			950.000,00		727.406,32	3.792.406,32	
5 Scuola primaria di Bagno (da trasformare in scuola dell'infanzia)	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C17815002550001	1.504.000,00	204.000,00			1.000.000,00		300.000,00			1.504.000,00	
6 Scuola dell'infanzia "T. Campanella"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C15817000560001	1.400.000,00						200.000,00			200.000,00	
7 Scuola primaria "Celestino V" (scuola primaria Valle Pretara)	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C15817000570001	2.400.000,00						300.000,00	2.100.000,00		2.400.000,00	
8 Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco	Comune di L'Aquila	Adeguamento sismico	C15817000580001	731.188,00						350.000,00	381.188,00		731.188,00	
9 Nuovo polo scolastico di Collemaggio - scuola secondaria di primo grado CARUCCO	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C18E17000240001	8.400.000,00						1.000.000,00		7.400.000,00	8.400.000,00	
10 Scuola primaria e scuola dell'infanzia "Viale Giovanni XXII"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C18E17000250001	9.450.000,00						1.000.000,00		8.450.000,00	9.450.000,00	
11 Scuola dell'infanzia e primaria S. Barbara, primaria S. Sisto	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C16F20000000001	6.595.616,57	70.931,00			3.800.568,57			2.724.117,00		6.595.616,57	
12 Scuola dell'infanzia Pettino e scuola dell'infanzia Vetulo	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C18E11000040001	5.461.700,00				2.861.700,00			2.600.000,00		5.461.700,00	
13 Polo scolastico di Sassa	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C17815002250001	12.000.000,00				8.000.000,00				4.000.000,00	12.000.000,00	
14 Nuovo polo scolastico di Collemaggio - scuola dell'infanzia "S. Bernardino" e primaria "De Amicis"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C12123000010001	10.200.000,00								10.200.000,00	10.200.000,00	
15 Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" loc. Paganica	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C17814000230004	6.796.000,00			4.270.000,00					2.526.000,00	6.796.000,00	
16 Scuola primaria di Arischia	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C14813000060004	2.605.680,21				2.605.680,21					2.605.680,21	
17 Polo scolastico Gignano - Torretta - S. Ella	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C17815002500001	5.670.000,00	470.000,00			5.200.000,00					5.670.000,00	
18 Edificio Scolastico "Mariele Ventre"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C14813000110004	6.903.462,00			6.903.462,00						6.903.462,00	
				112.018.746,89	744.931,00		6.903.462,00	6.385.000,00	23.467.948,78	500.000,00	6.170.419,60	7.805.305,00	33.303.406,32	85.280.472,70





Stato di attuazione

Denominazione	Stazione Appaltante	Tipologia Intervento	CUP	Importo approvato QE	Totale assegnato	Stato d'attuazione	Erogato
1 ITAS - Istituto Tecnico per le attività Sociali (AQ)	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia	F18E18000360001	7.404.498,00	500.000,00	Progettazione	492.150,00
2 Istituto d'istruzione secondario Convitto Nazionale "D. Cotugno" via L. Da Vinci	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	F18E19000030001	13.101.200,00	1.310.120,00	Programmazione	-
3 IPSIASAR - L. Da Vinci sito in Via Aldo Moro L'Aquila	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia	F18E17000040004	7.602.996,00	760.299,60	Programmazione	2.000,00
4 Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola, s.p. Mausonia	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C13H18000210001	3.792.406,32	3.792.406,32	Progettazione	33.800,00
5 Scuola primaria di Bagno (da trasformare in scuola dell'infanzia)	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C17B15002550001	1.504.000,00	1.504.000,00	Intervento chiuso	1.485.160,00
6 Scuola dell'infanzia "T. Campanella"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C15B17000560001	1.400.000,00	200.000,00	Programmazione	-
7 Scuola primaria "Celestino V" (scuola primaria Valle Pretara)	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C15B17000570001	2.400.000,00	2.400.000,00	Attuazione	312.500,00
8 Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco	Comune di L'Aquila	Adeguamento sismico	C15B17000580001	731.188,00	731.188,00	Progettazione	27.930,00
9 Nuovo polo scolastico di Collemaggio - scuola secondaria di primo grado CARDUCCI	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C18E17000140001	8.400.000,00	8.400.000,00	Programmazione	-
10 Scuola primaria e scuola dell'infanzia "Viale Giovanni XXIII"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C18E17000150001	9.450.000,00	9.450.000,00	Progettazione	8.200,00
11 Scuola dell'infanzia e primaria S. Barbara; primaria S. Sisto	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C16F20000000001	6.595.616,57	6.595.616,57	Attuazione	4.205.490,00
12 Scuola dell'infanzia Pettino e scuola dell'infanzia Vetoio	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C18E11000040001	5.461.700,00	5.461.700,00	Attuazione	2.666.778,05
13 Polo scolastico di Sassa	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C17B15002250001	12.000.000,00	12.000.000,00	Progettazione	373.000,00
14 Nuovo polo scolastico di Collemaggio - scuola dell'infanzia "S. Bernardino" e primaria "De Amicis"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C12J23000010001	10.200.000,00	10.200.000,00	Programmazione	-
15 Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" loc. Paganica	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C17B14000220004	6.796.000,00	6.796.000,00	Attuazione	1.835.440,00
16 Scuola primaria di Arischia	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C14B13000060004	2.605.680,00	2.605.680,21	Intervento chiuso	2.600.000,00
17 Polo scolastico Gignano - Torretta - S. Elia	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	C17B15002500001	5.670.000,00	5.670.000,00	Attuazione	3.490.070,00
18 Edificio Scolastico "Mariele Ventre"	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	C14B13000110004	6.903.462,00	6.903.462,00	Intervento chiuso	6.560.150,00
				112.018.746,89	85.280.472,70		17.532.518,05





3° Piano Annuale Scuole 2024

	Denominazione	Stazione Appaltante	Tipologia Intervento	Quadro Economico	Assegnato precedente	3° Piano Annuale	Finalità
1	IPSIASAR - L. Da Vinci sito in Via Aldo Moro L'Aquila	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia	6.146.922,10	760.299,60	5.386.622,50	Progett. Ed eseguz. Lavori
2	ITAS - Istituto Tecnico per le attività Sociale	Provincia dell'Aquila	Sostituzione Edilizia	9.892.838,26	500.000,00	9.392.838,26	Progett. Ed eseguz. Lavori
3	Scuola primaria di Bagno	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	515.000,00	-	515.000,00	Progett. Ed eseguz. Lavori
4	Polo scolastico Gignano - Torretta - S. Elia	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	8.445.200,00	5.670.000,00	2.775.200,00	Progett. Ed eseguz. Lavori
5	Scuola dell'infanzia e primaria S. Barbara; primaria S. Sisto	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	8.820.000,00	6.595.616,57	2.224.383,43	Esecuzione lavori
6	Scuola primaria "Celestino V" (scuola primaria Valle Pretara)	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia	3.542.500,00	2.400.000,00	1.142.500,00	Esecuzione lavori
7	Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" loc. Paganica	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	8.672.520,00	6.796.000,00	1.876.520,00	Progett. Ed eseguz. Lavori
8	Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola	Comune di L'Aquila	Sostituzione Edilizia con delocalizzazione	4.990.000,00	3.792.406,32	1.197.593,68	Progett. Ed eseguz. Lavori
				51.024.980,36	26.514.322,49	24.510.657,87	

